

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Iniciales del recurso	
1		<b>CONSULTORIA INVESTIGACION Y ESTUDIO DEL</b>	<b>40.75 días</b>	<b>jue 19/10/17</b>	<b>lun 08/01/18</b>		<b>De acuerdo a</b>	14   17
2		<b>TRABAJO DE CAMPO VMT</b>	<b>32 días</b>	<b>jue 19/10/17</b>	<b>vie 22/12/17</b>			
3		Adecuacion de Caminos y Planchada, accessos	2 días	jue 19/10/17	lun 23/10/17			
4		<b>POZO 1</b>	<b>17.5 días</b>	<b>lun 23/10/17</b>	<b>lun 27/11/17</b>			
5		Registro de Presion /Prueba de Produccion	1 día	lun 23/10/17	mié 25/10/17	3	TST	
6		DTM Equipo de Workover	0 días	mié 25/10/17	mié 25/10/17	5		
7		Ahogar Pozo / Sacar Arreglo	1.5 días	mié 25/10/17	sáb 28/10/17	6	WO	
8		Perfilaje de registros (RST/CBL)	1 día	sáb 28/10/17	lun 30/10/17	7	WR	
9		Interpretacion	5 días	lun 30/10/17	jue 09/11/17	8		
10		Baleo Reservorio 1	0.5 días	jue 09/11/17	vie 10/11/17	9;22	WO	
11		Bajar Arreglo de prueba	1 día	vie 10/11/17	dom 12/11/17	10	WO	
12		Prueba FTF	1 día	dom 12/11/17	mar 14/11/17	11	WO	
13		Ahogar, Sacar arrello, aislar Reservorio 1	1.5 días	mar 14/11/17	vie 17/11/17	12	WO	
14		Balear Reservorio 2	0.5 días	vie 17/11/17	sáb 18/11/17	13	WO	
15		Bajar Arreglo de prueba	1 día	sáb 18/11/17	lun 20/11/17	14	WO	
16		Prueba FTF	1 día	lun 20/11/17	mié 22/11/17	15	WO	
17		Ahogar, Sacar arreglo	1.5 días	mié 22/11/17	sáb 25/11/17	16	WO	
18		Bajar Arreglo Temporal	1 día	sáb 25/11/17	lun 27/11/17	17	WO	
19		<b>POZO 2</b>	<b>24 días</b>	<b>mié 25/10/17</b>	<b>mar 12/12/17</b>			
20		Registro de Presion /Prueba de Produccion	1 día	mié 25/10/17	vie 27/10/17	5	TST	
21		Ahogar Pozo, sacar arreglo	1 día	sáb 28/10/17	lun 30/10/17	7	WO	
22		Perfilaje de Registros (RST/CBL)	1 día	lun 30/10/17	mié 01/11/17	21	WR	
23		Interpretacion	3 días	mié 01/11/17	mar 07/11/17	22		


Proyecto: ANEXO 3 PLAN DE TR  
Fecha: mié 18/10/17

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Iniciales del recurso	
									14   17
24			Baleo Reservorio 3	0.5 días	lun 27/11/17	mar 28/11/17	23;18	WO	
25			Bajar Arreglo de prueba	1 día	mar 28/11/17	jue 30/11/17	24	WO	
26			Prueba FTF	1 día	jue 30/11/17	sáb 02/12/17	25	WO	
27			Ahogar, Sacar arrello, aislar Reservorio 3	1 día	sáb 02/12/17	lun 04/12/17	26	WO	
28			Balear Reservorio 1	0.5 días	lun 04/12/17	mar 05/12/17	27	WO	
29			Bajar Arreglo de prueba	1 día	mar 05/12/17	jue 07/12/17	28	WO	
30			Prueba FTF	1 día	jue 07/12/17	sáb 09/12/17	29	WO	
31			Ahogar, Sacar arreglo	1 día	sáb 09/12/17	lun 11/12/17	30	WO	
32			Bajar Arreglo Temporal	0.5 días	lun 11/12/17	mar 12/12/17	31	WO	
33			<b>POZO 3</b>	<b>3 días</b>	<b>mar 12/12/17</b>	<b>lun 18/12/17</b>			
34			Ahogar Pozo, sacar arreglo	1 día	mar 12/12/17	jue 14/12/17	32	WO	
35			Perfilaje de Registros (RST+Sonico/CBL)	1 día	jue 14/12/17	sáb 16/12/17	34	WR	
36			Bajar Arreglo Temporal	1 día	sáb 16/12/17	lun 18/12/17	35	WO	
37			Contingencias	2 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	36		
38			<b>TRABAJO DE GABINETE VMT</b>	<b>3.5 días</b>	<b>vie 22/12/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>			
39			Presentación de Informes Finales	3.5 días	vie 22/12/17	vie 29/12/17	37		


Proyecto: ANEXO 3 PLAN DE TR  
Fecha: mié 18/10/17

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

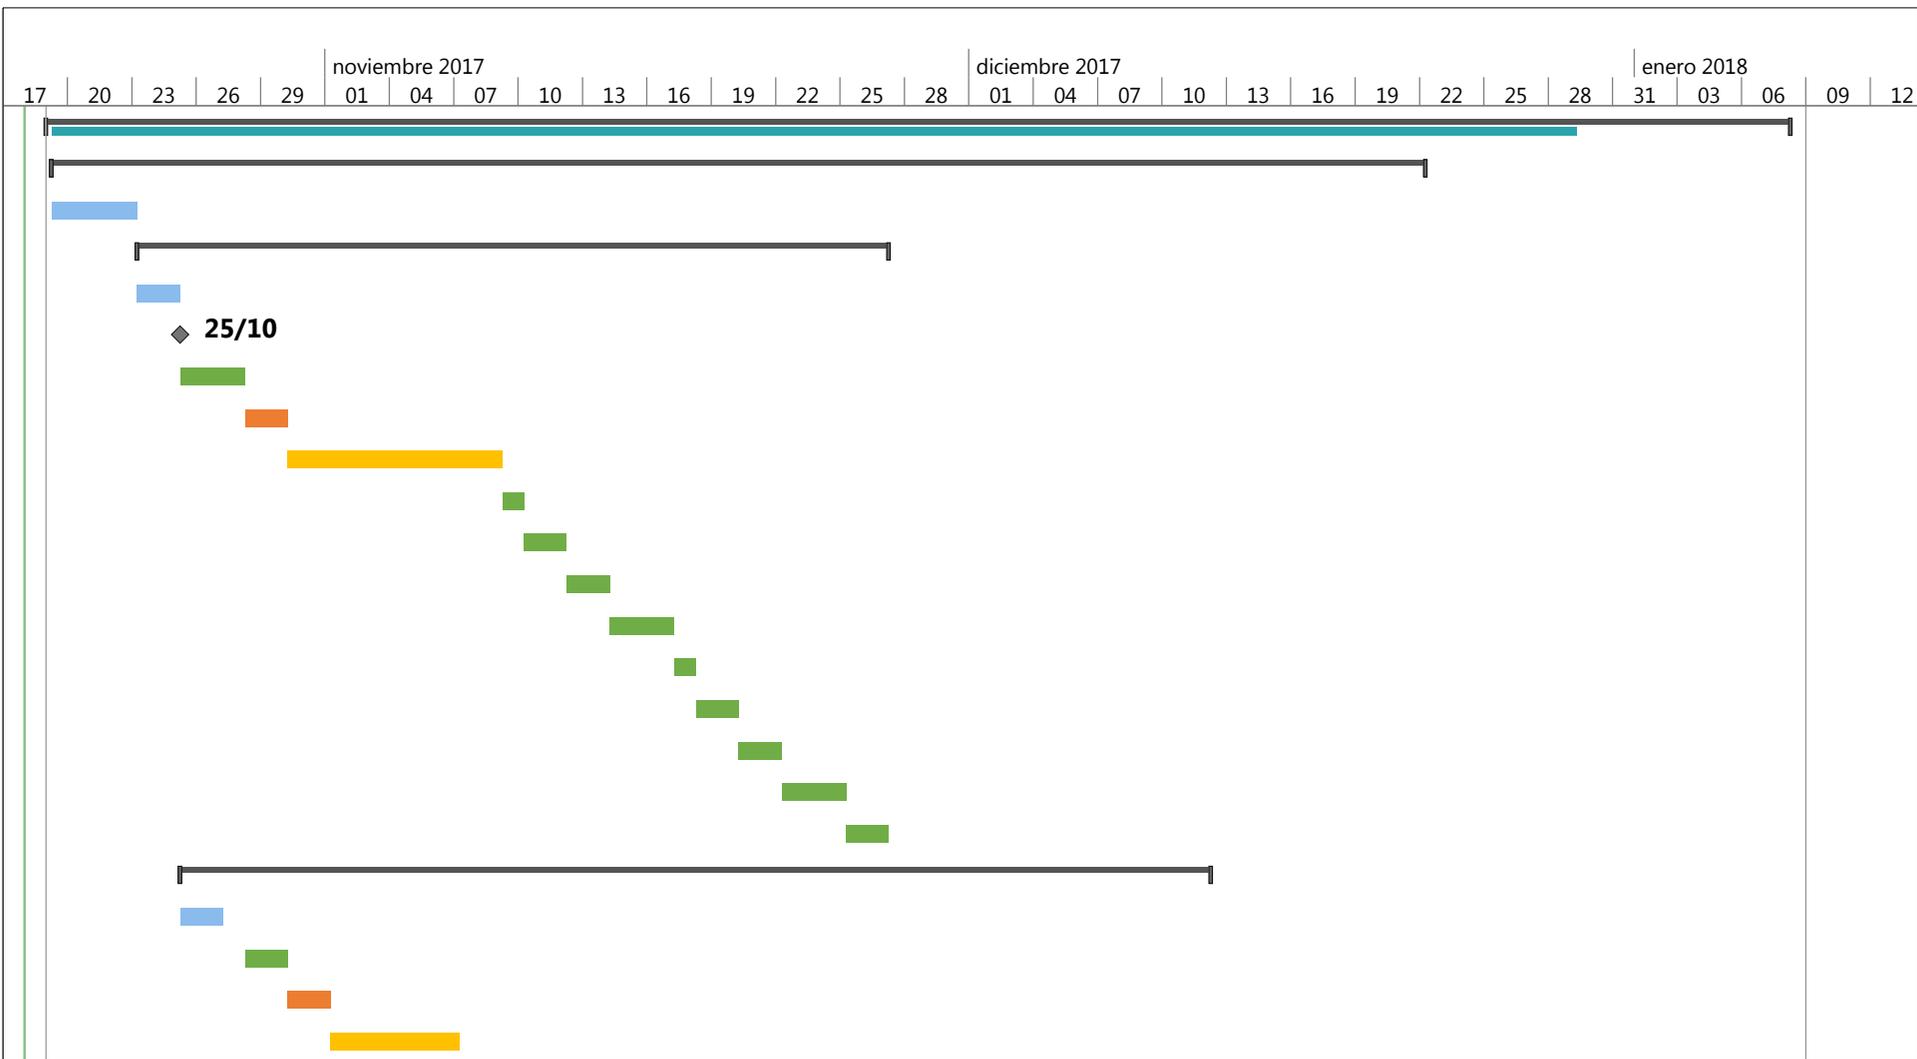

Proyecto: ANEXO 3 PLAN DE TR  
 Fecha: mié 18/10/17

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

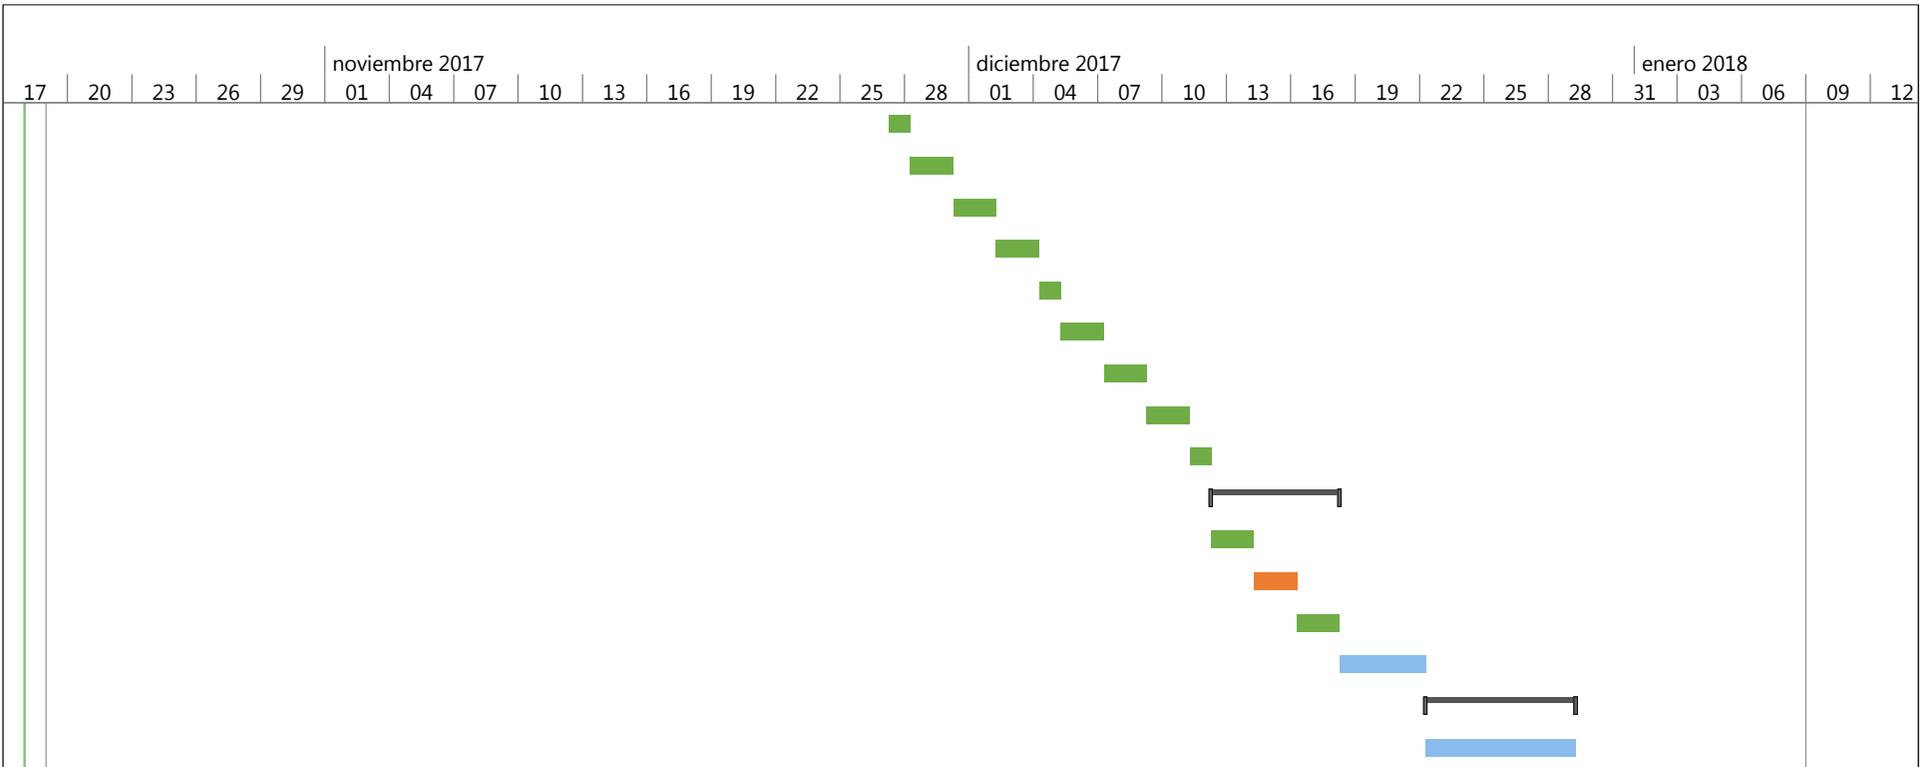

Proyecto: ANEXO 3 PLAN DE TR Fecha: mié 18/10/17	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | febrero 2018 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | marzo 2018 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | abril 2018 | 31 | 03 | 06 | 09

Proyecto: ANEXO 3 PLAN DE TR  
 Fecha: mié 18/10/17

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | febrero 2018 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | marzo 2018 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | abril 2018 | 31 | 03 | 06 | 09

Proyecto: ANEXO 3 PLAN DE TR  
 Fecha: mié 18/10/17

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

# CONSULTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CAMPO VILLAMONTES

